Nummer	Vorwegmaßnahmen	Dauer	Start	Ende	Vorgänger
1	Vergrämen und Absammeln der Zauneidechsen und weitere Maßnahmen gem. landschaftspflegerischen Begleitplan	173	01.07.2020	26.02.2021	
2	Maßnahmen zum Denkmalschutz	173	01.07.2020	26.02.2021	
3	Gehölzbeseitigung und Rodung gem. landschaftspflegerischen Begleitplan	107	01.10.2020	26.02.2021	
4	Baubeginn	0	01.03.2021	01.03.2021	
5	**Bauphase 1**	95	01.03.2021	12.07.2021	
6	**Bauphase 1 a**	95	01.03.2021	12.07.2021	
7	**Herstellung BW 1-03**	85	01.03.2021	28.06.2021	
8	Erdarbeiten	5	01.03.2021	08.03.2021	4
9	Bachverlegung	5	08.03.2021	15.03.2021	8
10	Spundwandarbeiten/restliche Erdarbeiten	25	15.03.2021	19.04.2021	9
11	Betonarbeiten	45	19.04.2021	21.06.2021	10
12	Geländewiederherstellung	5	21.06.2021	28.06.2021	11
13	Teilherstellung Ast St2156-B22 (außerhalb Bestandsfahrbahn inkl. Regenrückhaltebecken)	50	01.03.2021	10.05.2021	4
14	Fertigstellung Teilherstellung Ast St2156-B22 im Bereich BW1-03 (außerhalb Bestandsfahrbahn)	10	28.06.2021	12.07.2021	7
15	**Teilherstellung prov. Umfahrungsrampe (außerhalb Bestandsfahrbahn)**	65	01.03.2021	31.05.2021	
16	Oberboden und Erdarbeiten	7	01.03.2021	10.03.2021	4
17	Abklingen der Setzungen	50	08.03.2021	19.05.2021	16
18	Frostschutzschicht	2	19.05.2021	21.05.2021	17
19	Asphaltierung	2	21.05.2021	25.05.2021	18
20	Oberbodenauftrag und Bankette	2	25.05.2021	27.05.2021	19
21	Leitplanken, Verkehrssicherung	2	27.05.2021	31.05.2021	20
22	**Bauphase 1b**	15	01.03.2021	22.03.2021	
23	Herstellung Verbreiterung GVS Hof	15	01.03.2021	22.03.2021	4
24	**Bauphase 2**	45	12.07.2021	13.09.2021	5
25	**Bauphase 2a**	30	12.07.2021	23.08.2021	
26	Sperrung der St2156	0	12.07.2021	12.07.2021	14
27	Herstellung der Anschlüsse St2156 + St2156 alt	30	12.07.2021	23.08.2021	26
28	**Bauphase 2b**	30	12.07.2021	23.08.2021	
29	Einrichtung und Inbetriebnahme Umfahrung über Gewerbegebiet Hof mit Inbetriebnahme	0	12.07.2021	12.07.2021	23
30	Sperrung SAD42	0	12.07.2021	12.07.2021	29
31	Herstellung der provisorischen Umfahrung zum Busunternehmen	10	12.07.2021	26.07.2021	30
32	Inbetriebnahme neuer Anschluss St2156 an B22	0	23.08.2021	23.08.2021	27
33	**Bauphase 2c**	45	12.07.2021	13.09.2021	
34	**Fertigstellung prov. Umfahrungsrampe des KP Teunz (Lückenschluss)**	**20**	**12.07.2021**	**09.08.2021**	
35	Rückbau Straßenbau	5	12.07.2021	19.07.2021	30:15
36	Oberboden und Erdarbeiten	7	19.07.2021	28.07.2021	35
37	Frostschutzschicht	2	28.07.2021	30.07.2021	36
38	Asphaltierung	2	30.07.2021	03.08.2021	37
39	Oberbodenauftrag und Bankette	2	03.08.2021	05.08.2021	38
40	Leitplanken, Verkehrssicherung	2	05.08.2021	09.08.2021	39
41	Herstellung SAD 42 Teunzer Seite	35	26.07.2021	13.09.2021	31 ;30
42	**Bauphase 2d**	0	23.08.2021	23.08.2021	
43	Inbetriebnahme provisorische Umfahrung des KP Teunz	0	23.08.2021	23.08.2021	34 ;27
44	Sperrung B22 zwischen Einmündung St2156 und prov. Umfahrung	0	23.08.2021	23.08.2021	44
45	**Bauphase 3 (inkl. Winterpause von 20. Dez bis 25. Feb)**	180	13.09.2021	01.08.2022	24
46	**Herstellung BW 1-01**	180	13.09.2021	01.08.2022	44
47	Rückbau Straßenbau im gesamten Baufeld BW 1-01; 1-02 und 1-04	5	13.09.2021	20.09.2021	
48	Erdarbeiten	5	20.09.2021	27.09.2021	47
49	Bohrpfahlarbeiten	15	27.09.2021	18.10.2021	48
50	Erdarbeiten	5	18.10.2021	25.10.2021	49
51	Betonarbeiten	60	25.10.2021	28.03.2022	50
52	Verlegen der Fertigteilträger	2	28.03.2022	30.03.2022	51
53	Betonarbeiten	78	30.03.2022	18.07.2022	52
54	Geländerwiederherstellung	10	18.07.2022	01.08.2022	53
55	Bachverlegung im Baufeld BW1-02 und BW 1-04	10	04.10.2021	18.10.2021	64
56	**Herstellung BW 1-02**	95	20.09.2021	11.04.2022	47
57	Erdarbeiten	5	20.09.2021	27.09.2021	
58	Spundwandarbeiten (inkl. Lockerungsbohrungen)	15	18.10.2021	08.11.2021	49
59	Abbruch Bestand	5	08.11.2021	15.11.2021	58
60	restliche Erdarbeiten	5	15.11.2021	22.11.2021	59
61	Betonarbeiten	45	22.11.2021	04.04.2022	60
62	Geländewiederherstellung	5	04.04.2022	11.04.2022	61
63	**Herstellung BW 1-04**	135	27.09.2021	13.06.2022	47
64	Erdarbeiten	5	27.09.2021	04.10.2021	57
65	Spundwandarbeiten(inkl. Austauschbohrungen)	20	08.11.2021	06.12.2021	58
66	Abbruch Bestand	5	06.12.2021	13.12.2021	65 ;59
67	restliche Erdarbeiten	5	13.12.2021	28.02.2022	66 ;60
68	Betonarbeiten	45	04.04.2022	06.06.2022	67 ;61
69	Geländewiederherstellung	5	06.06.2022	13.06.2022	68 ;62
70	**Bauphase 4**	125	01.08.2022	23.01.2023	
71	**Bauphase 4a**	65	01.08.2022	31.10.2022	
72	Fertigstellung der Dämme der SAD 42 mit Bauwerkshinterfüllung	65	01.08.2022	31.10.2022	46 ;56 ;63
73	Fertigstellung der B22 zwischen Einmündung St2156 und prov. Umfahrung	25	01.08.2022	05.09.2022	46 ;63
74	Rückverlegung Verkehr auf B22 und Sperrung Provisorium	0	05.09.2022	05.09.2022	73
75	**Bauphase 4b**	60	31.10.2022	23.01.2023	
76	Rückbau Umfahrung	10	31.10.2022	14.11.2022	74 ;72
77	Fertigstellung der Anschlüsse der SAD 42 an die St2156	25	31.10.2022	05.12.2022	74 ;72
78	Fertigstellung SAD 42 inkl. Feldwegzufahrt	25	05.12.2022	09.01.2023	77
79	Sperrung und Rückbau der prov. Umfahrung zum Busunternehmen mit Herstellung der SAD im Bereich des Anschlusses	10	09.01.2023	23.01.2023	78
80	Inbetriebnahme SAD 42	0	23.01.2023	23.01.2023	79
81	Fertigstellung Knotenpunkt Teunz	0	23.01.2023	23.01.2023	80
82	Rückbau Umfahrung Hof wird in einer gesonderten Vereinbarung geregelt	0	23.01.2023	23.01.2023	80
83	Ende der Maßnahme	0	23.01.2023	23.01.2023	81 ;82

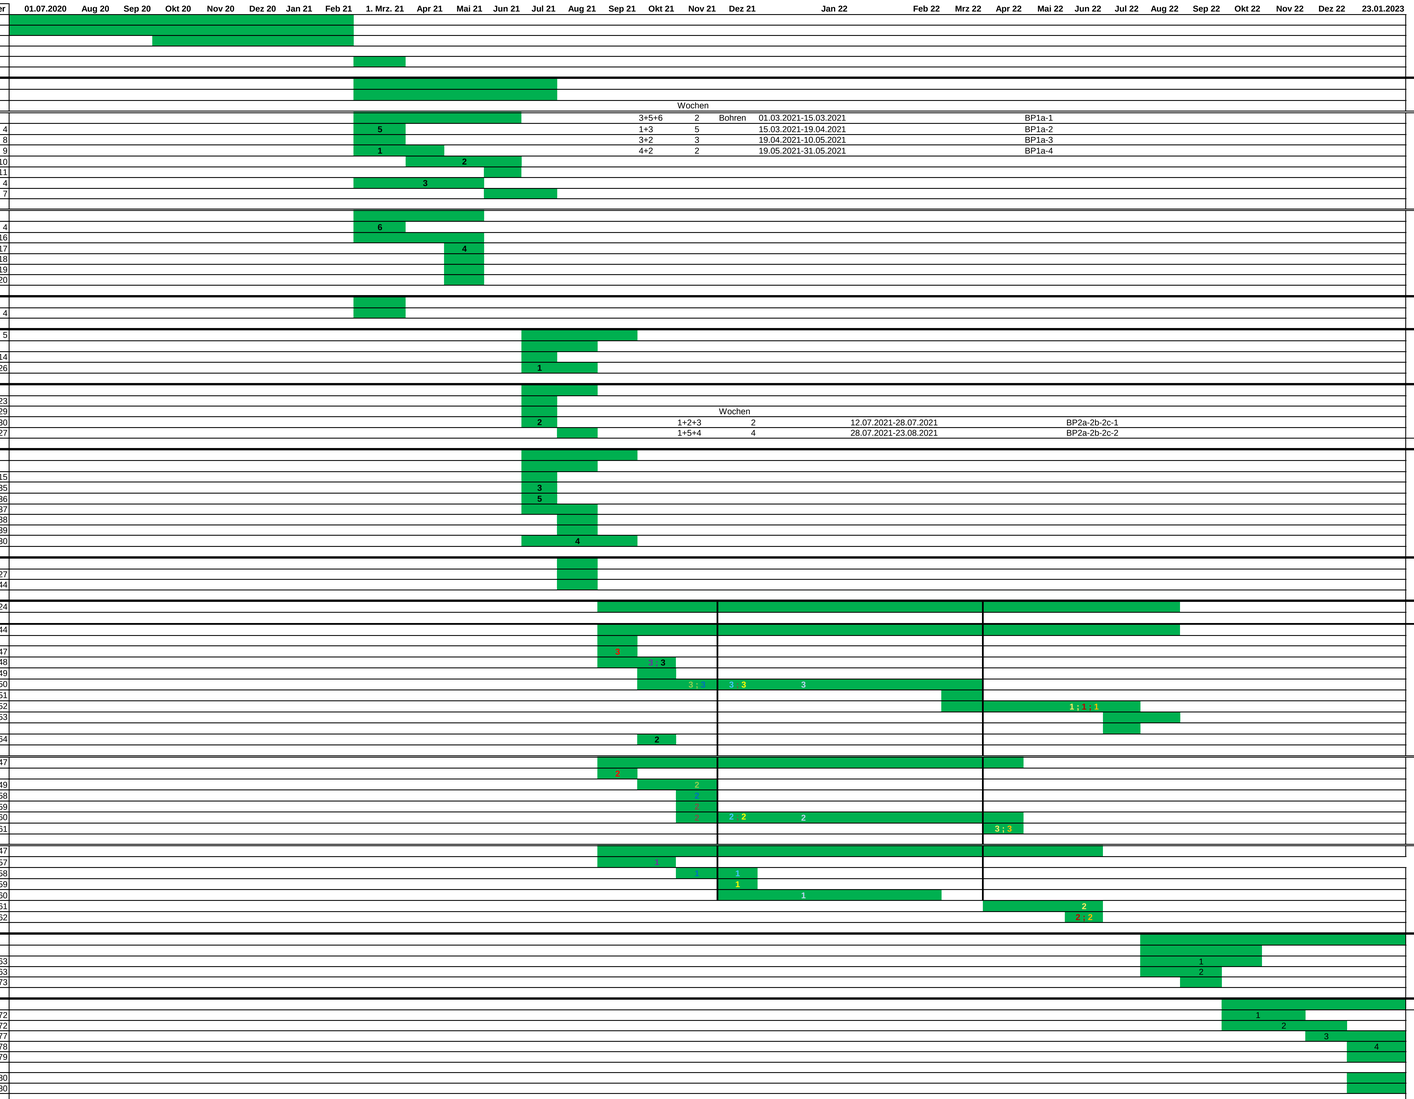

	Wochen		
2 + 3	1	20.09.2021-27.09.2021	BP3-1
1 + 3	1	27.09.2021 - 04.10.2021	BP3-2
2 + 3	2	04.10.2021 - 18.10.2021	BP3-3
2 + 3	3	18.10.2021 - 08.11.2021	BP3-4
1 + 2 +3	1	08.11.2021 - 15.11.2021	BP3-5
1+2+3	3	15.11.2021 - 06.12.2021	BP3-6
1+5+2	1	06.12.2021 -13.12.2021	BP3-7
1+2+3	5	13.12.2021 - 28.03.2022	BP3-8
1+2+3	2	28.03.2022 - 11.04.2022	BP3-9
1+2	14	11.04.2022 - 18.07.2022	BP3-10
1 + 2	5	01.08.2022 - 05.09.2022	BP4a
1 + 2	2	31.10.2022 - 14.11.2022	BP4b-1
3	5	05.12.2022 - 09.01.2023	BP4b-2
4	2	09.01.2023 - 23.01.2023	BP4b-3

Himweis: ***Die Bauzeiten der verschiedenen Bauphasen sind an den korrekten Datumsangaben ersichtlich. Die graphische Balkendarstellung kann programmbedingt (EXEL) leicht davon abweichen. Somit kann es zu bildlich dargestellten Überlappungen kommen, welche nach den korrekten Datumsangaben nicht vorliegen.***
